

REGIONE CAMPANIA

COMUNE DI GALLO MATESE

Provincia di Caserta

**SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA
DELLA STRADA S.P. 89 E DELLE STRADE
DI COLLEGAMENTO CON GALLO CENTRO E VALLELUNGA**

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Tavola:

19

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Antonio Emilio Fortini

Scala:

Data :

Dicembre 2018

IL PROGETTISTA
Ing. Pompeo Furno

Comune di GALLO MATESE

Provincia di Caserta


Cronoprogramma di PROGETTO

OGGETTO: SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA S.P. 89 E DELLE STRADA DI COLLEGAMENTO CON GALLO CENTRO E VALLELUNGA

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

Il Tecnico
(ing. Furno Pompeo)

ID	Nome attività	Durata	Importo	Mese 1		Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6				Mese 7				Mese 8				Mese 9				Mese 10				Mese 11			
				s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32	s33	s34	s35	s36	s37	s38	s39	s40	s41	s42
1	Avvio indizione gara di Appalto	19 g	0,00	[Barra blu]																																									
2	Affidamento lavori a seguito di gara di appalto	64 g	0,00	[Barra blu]																																									
3	Avvio cantiere	2 g	0,00	[Barra blu]																																									
4	Movimenti terra	77 g	289'859,33	[Barra grigia]																																									
5	Demolizione strutture in c/c - pulizia stradale - esurto	9 g	54'754,44	[Barra blu]																																									
6	Scavi in genere - distacco e trasporto	25 g	60'987,29	[Barra blu]																																									
7	Fresa lura	5 g	174'117,60	[Barra blu]																																									
8	Corpo stradale	71 g	1'034'901,64	[Barra grigia]																																									
9	Fondazione strade, rinterri ec	14 g	61'166,04	[Barra blu]																																									
10	Pavimentazione stradale	20 g	510'059,71	[Barra blu]																																									
11	Barriere stradali	15 g	409'439,55	[Barra blu]																																									
12	Segnaletti stradale orizzontale	3 g	54'236,34	[Barra blu]																																									
13	Opere d'arte (muretti - zane II - muri sotto scala)	34 g	311'812,03	[Barra blu]																																									
14	Impianto illuminazione stradale	11 g	26'422,09	[Barra blu]																																									
15	Pavimentazione e rivestimenti in pietra naturale	16 g	214'823,64	[Barra blu]																																									
16	Oneri Sicurezza	106 g	0,00	[Barra blu]																																									
17	Smobilizzo cantiere	1 g	0,00	[Barra blu]																																									

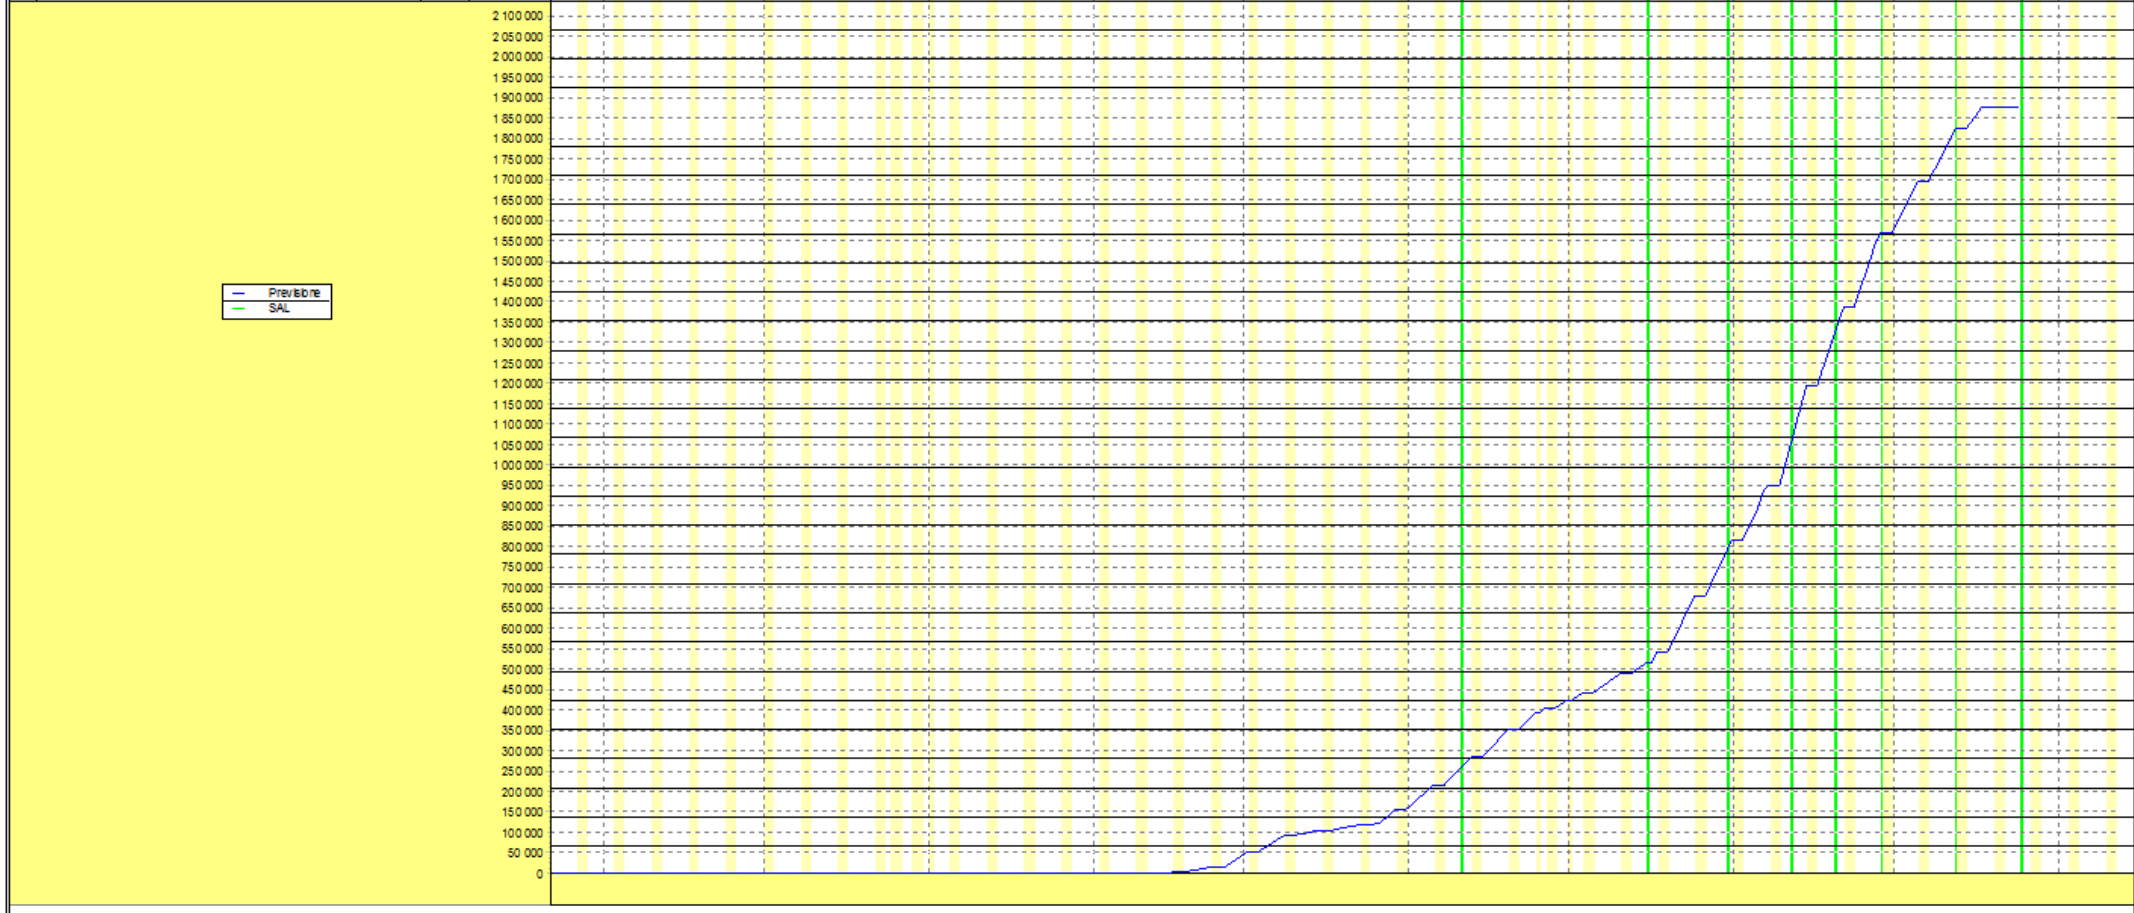

Comune di GALLO MATESE

Provincia di Caserta

Tabella Attività

OGGETTO: SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA S.P. 89 E DELLE STRADA DI COLLEGAMENTO CON GALLO CENTRO E VALLELUNGA

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

Il Tecnico
(ing. Furno Pompeo)

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
Avvio Indizione gara di Appalto	0.00	0.00	1 gg	25 gg	19	25
Affidamento lavori a seguito di gara di appalto	0.00	0.00	29 gg	121 gg	64	93
Avvio cantiere	0.00	0.00	127 gg	128 gg	2	2
Movimenti terra	289'859,33	15,44	128 gg	236 gg	77	109
* Demolizione strutture in cls - pulizia stradale - espurgo	54'754,44	2.92	128 gg	138 gg	9	11
* Scavi in genere - disfaccimento e trasporto	60'987,29	3.25	134 gg	166 gg	25	33
* Fresatura	174'117,60	9.27	232 gg	236 gg	5	5
Corpo Stradale	1'034'901,64	55,11	169 gg	269 gg	71	101
* Fondazioens tradale, rinterrì ec	61'166,04	3.26	169 gg	187 gg	14	19
* Pavimentazione stradale	510'059,71	27,16	239 gg	264 gg	20	26
* Barriere stradali	409'439,55	21,80	208 gg	228 gg	15	21
* Segnaleti stradale orizzontale	54'236,34	2,89	267 gg	269 gg	3	3
Opere d'arte (muretti - zanell - muri sottoscarpa)	311'812,03	16,61	157 gg	206 gg	34	50
Impianto illuminazione stradale	26'422,09	1,41	117 gg	131 gg	11	15
Pavimentazione e rivestimenti in pietra naturale	214'823,64	11,44	228 gg	249 gg	16	22
Oneri Sicurezza	0.00	0.00	127 gg	276 gg	106	150
Smobilizzo cantiere	0.00	0.00	276 gg	276 gg	1	1
Data,						
Tecnico ing. Furno Pompeo						
